



Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
SC Progettazione e Innovazione Tecnologica

progettazione.innovazione@aouss.it



A.D. MDLXII

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI GAMMACAMERE
SPECT-TC PER LA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE:
LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO
NEL PALAZZO DELLA CLINICA MEDICA FINALIZZATO
ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE GAMMACAMERE**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO:

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:
DIAGRAMMA DI GANTT**

IL PROGETTISTA:

**ORDINE INGEGNERI**
PROVINCE DI SASSARI
E OLBIA TEMPIO
N° 573 Dott. Ing. Roberto Gino Manca
*Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e
dell'Informazione Sezione A - Settore a,b,c*

COLLABORATORE PROGETTAZIONE:

Arch. Renato Meloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

IL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE GENERALE:

SASSARI 16/03/2026

SCALA 1:xx

S.02

ALLEGATO "A"

Comune di SASSARI
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI GAMMACAMERE SPECT-TC PER LA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE:

LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO NEL PALAZZO DELLA CLINICA MEDICA FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE GAMMACAMERE

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI.

CANTIERE: VIALE S. PIETRO 10, SASSARI (SS)

SASSARI, 16/03/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE MANCA ROBERTO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DIRETTORE GENERALE AOU SASSARI Ponti Serafinangelo)

INGEGNERE MANCA ROBERTO

VIALE SAN PIETRO, 10
07100 SASSARI (SS)
Tel.: 0792830636

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI GAMMACAMERE SPECT-TC PER LA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE:
LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO NEL PALAZZO DELLA CLINICA MEDICA FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DI
NUOVE GAMMACAMERE

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
FASE 1						
RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	4	1	1	03/06/2026	03/06/2026
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	4	1	1	03/06/2026	03/06/2026
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	4	1	1	04/06/2026	04/06/2026
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	4	1	1	05/06/2026	05/06/2026
Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	08/06/2026	08/06/2026
Demolizioni e rimozioni sala gammacamere 1, bagno disabili, ingresso sul retro						
Rimozione vecchia Gammacamera Spect TC	2	6	3	3	03/06/2026	05/06/2026
Assistenza alla movimentazione per rimozione vecchia e posizionamento nuova Gammacamera	2	4	1	1	05/06/2026	05/06/2026
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	2	1	1	1	08/06/2026	08/06/2026
Rimozione di serramenti interni	2	4	3	3	08/06/2026	10/06/2026
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2	4	3	3	09/06/2026	11/06/2026
Rimozione di pannelli di controsoffitto	2	4	2	2	10/06/2026	11/06/2026
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastiche	2	4	4	6	11/06/2026	16/06/2026
Rimozione di pavimento in marmo	2	4	3	3	16/06/2026	18/06/2026
Rimozione di massetto	2	4	3	3	16/06/2026	18/06/2026
UTA E POMPA DI CALORE						
Rimozione di pavimentazioni esterne in mattoni di cls	1	4	2	2	09/06/2026	10/06/2026
Scavo a sezione ristretta per basamenti e fondazione struttura in acciaio	1	4	2	2	10/06/2026	11/06/2026
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	4	1	1	12/06/2026	12/06/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	4	2	2	15/06/2026	16/06/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	4	2	2	17/06/2026	18/06/2026
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	1	4	3	3	29/06/2026	01/07/2026
Installazione di U.T.A.	1	2	2	2	01/07/2026	02/07/2026
POSA POMPA DI CALORE e RELATIVE TUBAZIONI	1	2	4	4	30/06/2026	03/07/2026
Posa di pompa di calore Split	1	2	2	2	29/06/2026	30/06/2026
Divisori						
Realizzazione di tramezzature interne	2	4	3	3	22/06/2026	24/06/2026
Posa in opera di lastre di piombo pareti interne sale gammacamere	2	4	4	6	26/06/2026	01/07/2026
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	2	4	4	6	24/06/2026	29/06/2026
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti						
Formazione di massetto per pavimenti interni	2	4	3	3	21/07/2026	23/07/2026
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	4	4	6	23/07/2026	28/07/2026
Posa di pavimenti per interni in resina	2	4	7	9	28/07/2026	05/08/2026
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	2	4	4	6	06/08/2026	11/08/2026
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	2	4	4	6	12/08/2026	17/08/2026

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI GAMMACAMERE SPECT-TC PER LA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE:

LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO NEL PALAZZO DELLA CLINICA MEDICA FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DI

NUOVE GAMMACAMERE

Tabella Analitica Gantt

IMPIANTISTICA						
Rimozione di impianti idrico-sanitari	2	3	1	1	01/07/2026	01/07/2026
Rimozione di impianti termici	2	2	3	5	02/07/2026	06/07/2026
Rimozione di impianti elettrici	2	1	2	2	02/07/2026	03/07/2026
	2	1	2	2	06/07/2026	07/07/2026
Realizzazione canalizzazioni per impianti aeraulici	1	2	4	4	06/07/2026	09/07/2026
	2	2	4	4	13/07/2026	16/07/2026
Spostamenti/integrazioni e nuove linee ed accessori impianto elettrico e speciali	2	1	6	8	07/07/2026	14/07/2026
	2	1	4	6	12/08/2026	17/08/2026
Nuovo impianto gas medicinali	2	3	5	7	15/07/2026	21/07/2026
	2	3	3	3	12/08/2026	14/08/2026
Realizzazione di impianto elettrico	2	E	4	4	20/07/2026	23/07/2026
Installazione di corpi illuminanti	2	E	4	6	07/08/2026	12/08/2026
Realizzazione di impianto di rete dati	2	E	4	6	16/07/2026	21/07/2026
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	2	E	3	3	20/07/2026	22/07/2026
FASE 2						
Montaggio di serramenti interni	3	4	2	4	14/08/2026	17/08/2026
FASE 3						
IMPIANTISTICA						
Completamento posa canalizzazioni per aria condizionata	4	2	3	5	13/08/2026	17/08/2026
Completamento impianto elettrico e speciali	4	1	3	3	01/09/2026	03/09/2026
Completamento impianto gas medicinali	4	3	3	3	01/09/2026	03/09/2026
Controsoffitti						
Completamento controsoffitto in lamierino d'acciaio	4	4	5	7	04/09/2026	10/09/2026
Installazione nuova Gammacamera Spect TC	4	5	20	28	14/08/2026	10/09/2026
Assistenza alla movimentazione e posizionamento nuova Gammacamera	4	4	2	4	14/08/2026	17/08/2026
COLAUDI IMPIANTI E GAMMA CAMERE	4	E	10	14	11/09/2026	24/09/2026
FASE 4						
Demolizioni e rimozioni Sala 2 e Sala da adibire ad ambulatorio						
Rimozione di serramenti interni	5	4	2	2	30/09/2026	01/10/2026
smontaggio e rimozione vecchia Gammacamera Spect TC	5	E	3	5	25/09/2026	29/09/2026
Assistenza alla movimentazione per rimozione vecchia Gammacamera	5	E	2	2	28/09/2026	29/09/2026
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	5	4	3	5	02/10/2026	06/10/2026
Rimozione di pannelli di controsoffitto	5	4	2	2	30/09/2026	01/10/2026
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastiche	5	4	4	4	05/10/2026	08/10/2026
Rimozione di pavimento in marmo	5	4	2	2	05/10/2026	06/10/2026
Rimozione di massetto	5	4	3	3	05/10/2026	07/10/2026
Divisori						
Realizzazione di tramezzature interne	5	4	4	6	07/10/2026	12/10/2026
Posa in opera di lastre di piombo pareti interne sale gammacamere	5	4	3	3	12/10/2026	14/10/2026
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	5	4	4	6	08/10/2026	13/10/2026
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti						
Formazione di massetto per pavimenti interni	5	4	3	3	20/10/2026	22/10/2026

Tabella Analitica Gantt

Formazione intonaci interni (tradizionali)	5	4	4	6	23/10/2026	28/10/2026
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	5	4	3	5	30/10/2026	03/11/2026
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	5	4	4	4	02/11/2026	05/11/2026
Posa di pavimenti per interni in resina	5	4	10	14	06/11/2026	19/11/2026
IMPIANTISTICA						
Rimozione di impianti termici	5	2	4	4	05/10/2026	08/10/2026
Rimozione di impianti elettrici	5	1	3	3	30/09/2026	02/10/2026
Posa in opera di canalizzazioni per aria condizionata	5	2	4	4	13/10/2026	16/10/2026
Impianto distribuzione gas medicinali	5	3	3	3	19/10/2026	21/10/2026
Realizzazione di impianto elettrico	5	E	4	4	20/10/2026	23/10/2026
Installazione di corpi illuminanti	5	E	4	6	22/10/2026	27/10/2026
Realizzazione di impianto di rete dati	5	E	4	4	26/10/2026	29/10/2026
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	5	E	3	3	28/10/2026	30/10/2026
Completamento impianto elettrico e speciali	5	1	4	6	20/11/2026	25/11/2026
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI						
Montaggio di serramenti interni	5	4	3	5	20/11/2026	24/11/2026
FASE 5						
Demolizioni e rimozioni sala controllo						
Rimozione di serramenti interni	6	4	1	1	23/11/2026	23/11/2026
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	6	4	2	2	24/11/2026	25/11/2026
Rimozione di pannelli di controsoffitto	6	4	1	1	25/11/2026	25/11/2026
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastiche	6	4	2	2	26/11/2026	27/11/2026
Divisori						
Realizzazione di tramezzature interne	6	4	2	2	30/11/2026	01/12/2026
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti						
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	6	4	2	2	01/12/2026	02/12/2026
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	6	4	2	2	03/12/2026	04/12/2026
Posa di pavimenti per interni in resina	6	4	6	9	07/12/2026	15/12/2026
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI						
Montaggio di serramenti interni	6	4	2	2	16/12/2026	17/12/2026
FASE 6						
Controsoffitti						
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	7	4	4	6	11/12/2026	16/12/2026
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI						
Montaggio di serramenti interni	7	4	3	3	15/12/2026	17/12/2026
Installazione nuova Gammacamera Spect TC	7	2	20	33	18/12/2026	19/01/2027
Assistenza alla movimentazione e posizionamento nuova Gammacamera	7	E	2	4	18/12/2026	21/12/2026
COLAUDI IMPIANTI E GAMMA CAMERE	7	E	10	14	20/01/2027	02/02/2027
FASE 7						
Demolizioni e rimozioni						
Rimozione di pannelli di controsoffitto	8	4	1	1	28/12/2026	28/12/2026
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastiche	8	4	2	2	29/12/2026	30/12/2026
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti						

Tabella Analitica Gantt

Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	8	4	2	3	05/01/2027	07/01/2027
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	8	4	5	7	08/01/2027	14/01/2027
Posa di pavimenti per interni in resina	8	4	3	3	13/01/2027	15/01/2027
IMPIANTISTICA						
Rimozione di impianti termici	8	2	2	2	29/12/2026	30/12/2026
Rimozione di impianti elettrici	8	1	2	2	30/12/2026	31/12/2026
Posa canalizzazioni per aria condizionata	8	2	6	9	04/01/2027	12/01/2027
Posa impianto gas medicinali	8	3	5	5	11/01/2027	15/01/2027
Realizzazione di impianto elettrico	8	E	6	8	13/01/2027	20/01/2027
Realizzazione di impianto di rete dati	8	E	5	7	19/01/2027	25/01/2027
Installazione di corpi illuminanti	8	E	4	6	27/01/2027	01/02/2027
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	8	E	3	3	27/01/2027	29/01/2027
Completamento impianto elettrico e speciali	8	1	3	3	02/02/2027	04/02/2027
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI						
Montaggio di serramenti interni	8	4	1	1	02/02/2027	02/02/2027
Smobilizzo del cantiere	1	4	2	4	05/02/2027	08/02/2027

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = zona esterna all'edificio
- 2) = zona interna fase 1
- 3) = zona interna fase 2
- 4) = zona interna fase 3
- 5) = zona interna fase 4
- 6) = zona interna fase 5
- 7) = zona interna fase 6
- 8) = zona interna fase 7


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


- 1) = APPALTATORE OG11 - IMPIANTI elettrici
 - 2) = APPALTATORE OG11 - IMPIANTI MECCANICI
 - 3) = SUBAPPALTATORE - IMPIANTI GAS MEDICINALI
 - 4) = SUBAPPALTATRICE - OPERE EDILI
 - 5) = APPALTATORE FORNITURA NUOVE GAMMA CAMERE SPECT TC
 - 6) = SUBAPPALTATORE SMOTAGGIO E RIMOZIONE VECCHIE GAMMA CAMERE
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

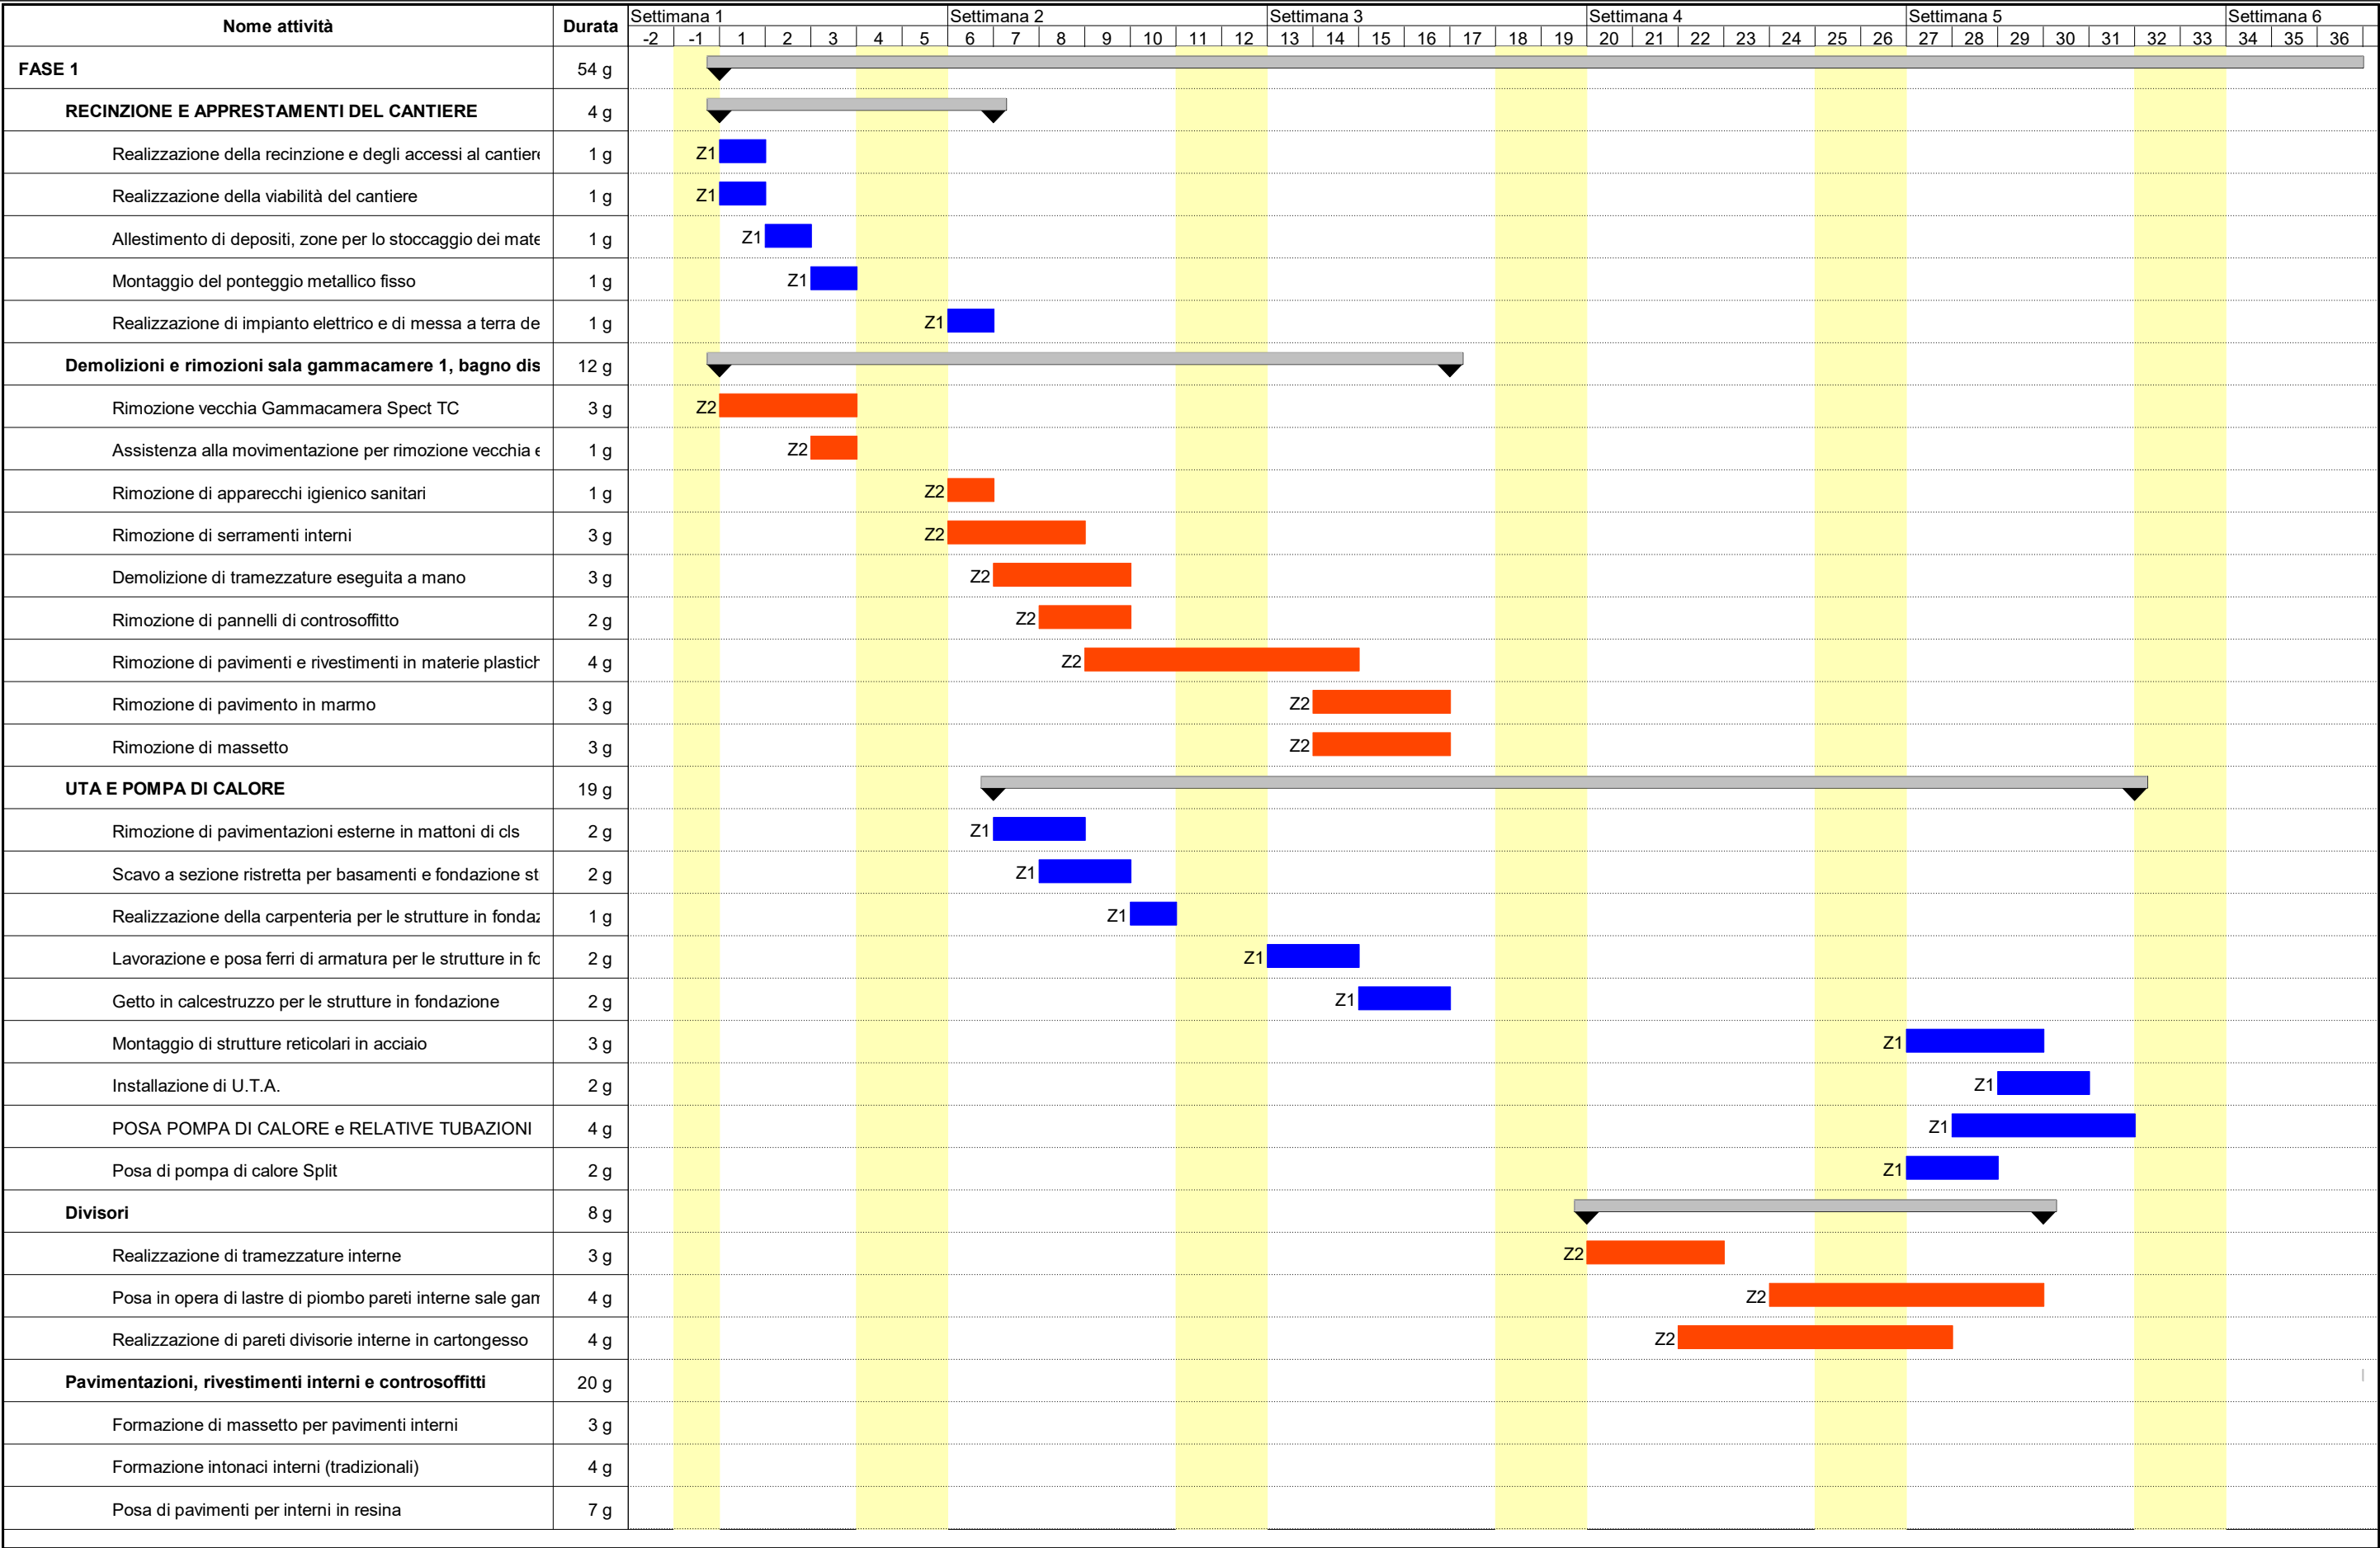


Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	4 g																																									
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	4 g																																									
IMPIANTISTICA	34 g																																									
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1 g																																									
Rimozione di impianti termici	3 g																																									
Rimozione di impianti elettrici	4 g																																									
Realizzazione canalizzazioni per impianti aeraulici	8 g																																									
Spostamenti/integrazioni e nuove linee ed accessori impi	10 g																																									
Nuovo impianto gas medicinali	8 g																																									
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																																									
Installazione di corpi illuminanti	4 g																																									
Realizzazione di impianto di rete dati	4 g																																									
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impi	3 g																																									
FASE 2	2 g																																									
Montaggio di serramenti interni	2 g																																									
FASE 3	21 g																																									
IMPIANTISTICA	16 g																																									
Completamento posa canalizzazioni per aria condizionata	3 g																																									
Completamento impianto elettrico e speciali	3 g																																									
Completamento impianto gas medicinali	3 g																																									
Controsoffitti	5 g																																									
Completamento controsoffitto in lamierino d'acciaio	5 g																																									
Installazione nuova Gammacamera Spect TC	20 g																																									
Assistenza alla movimentazione e posizionamento nuova Gammaca	2 g																																									
COLAUDI IMPIANTI E GAMMA CAMERE	10 g																																									
FASE 4	44 g																																									
Demolizioni e rimozioni Sala 2 e Sala da adibire ad ambu	10 g																																									
Rimozione di serramenti interni	2 g																																									
smontaggio e rimozione vecchia Gammacamera Spect	3 g																																									
Assistenza alla movimentazione per rimozione vecchia	2 g																																									
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3 g																																									
Rimozione di pannelli di controsoffitto	2 g																																									
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastiche	4 g																																									
Rimozione di pavimento in marmo	2 g																																									
Rimozione di massetto	3 g																																									

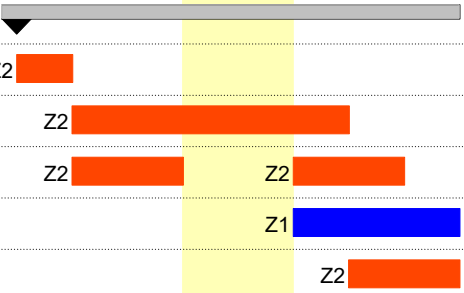


Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
Divisori	6 g																																										
Realizzazione di tramezzature interne	4 g																																										
Posa in opera di lastre di piombo pareti interne sale gan	3 g																																										
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	4 g																																										
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti	23 g																																										
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g																																										
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g																																										
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	3 g																																										
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	4 g																																										
Posa di pavimenti per interni in resina	10 g																																										
IMPIANTISTICA	41 g																																										
Rimozione di impianti termici	4 g																																										
Rimozione di impianti elettrici	3 g																																										
Posa in opera di canalizzazioni per aria condizionata	4 g																																										
Impianto distribuzione gas medicinali	3 g																																										
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																																										
Installazione di corpi illuminanti	4 g																																										
Realizzazione di impianto di rete dati	4 g																																										
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im	3 g																																										
Completamento impianto elettrico e speciali	4 g																																										
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI	3 g																																										
Montaggio di serramenti interni	3 g																																										
FASE 5	18 g																																										
Demolizioni e rimozioni sala controllo	5 g																																										
Rimozione di serramenti interni	1 g																																										
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2 g																																										
Rimozione di pannelli di controsoffitto	1 g																																										
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastic	2 g																																										
Divisori	2 g																																										
Realizzazione di tramezzature interne	2 g																																										
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti	10 g																																										
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	2 g																																										
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	2 g																																										
Posa di pavimenti per interni in resina	6 g																																										
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI	2 g																																										

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
Montaggio di serramenti interni	2 g																																											
FASE 6	5 g																																											
Controsoffitti	4 g																																											
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	4 g																																											
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI	3 g																																											
Montaggio di serramenti interni	3 g																																											
Installazione nuova Gammacamera Spect TC	20 g																																											
Assistenza alla movimentazione e posizionamento nuova Gammacamera	2 g																																											
COLAUDI IMPIANTI E GAMMA CAMERE	10 g																																											
FASE 7	27 g																																											
Demolizioni e rimozioni	3 g																																											
Rimozione di pannelli di controsoffitto	1 g																																											
Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materie plastiche	2 g																																											
Pavimentazioni, rivestimenti interni e controsoffitti	8 g																																											
Posa di rivestimenti murali in pvc autoadesivo	2 g																																											
Realizzazione di controsoffitti in lamierino d'acciaio	5 g																																											
Posa di pavimenti per interni in resina	3 g																																											
IMPIANTISTICA	26 g																																											
Rimozione di impianti termici	2 g																																											
Rimozione di impianti elettrici	2 g																																											
Posa canalizzazioni per aria condizionata	6 g																																											
Posa impianto gas medicinali	5 g																																											
Realizzazione di impianto elettrico	6 g																																											
Realizzazione di impianto di rete dati	5 g																																											
Installazione di corpi illuminanti	4 g																																											
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianti	3 g																																											
Completamento impianto elettrico e speciali	3 g																																											
NUOVI INFISSI/SERRAMENTI INTERNI	1 g																																											
Montaggio di serramenti interni	1 g																																											
Smobilizzo del cantiere	2 g																																											
LEGENDA Zona:																																												
Z1 = zona esterna all'edificio																																												
Z2 = zona interna fase 1																																												

[illegible]

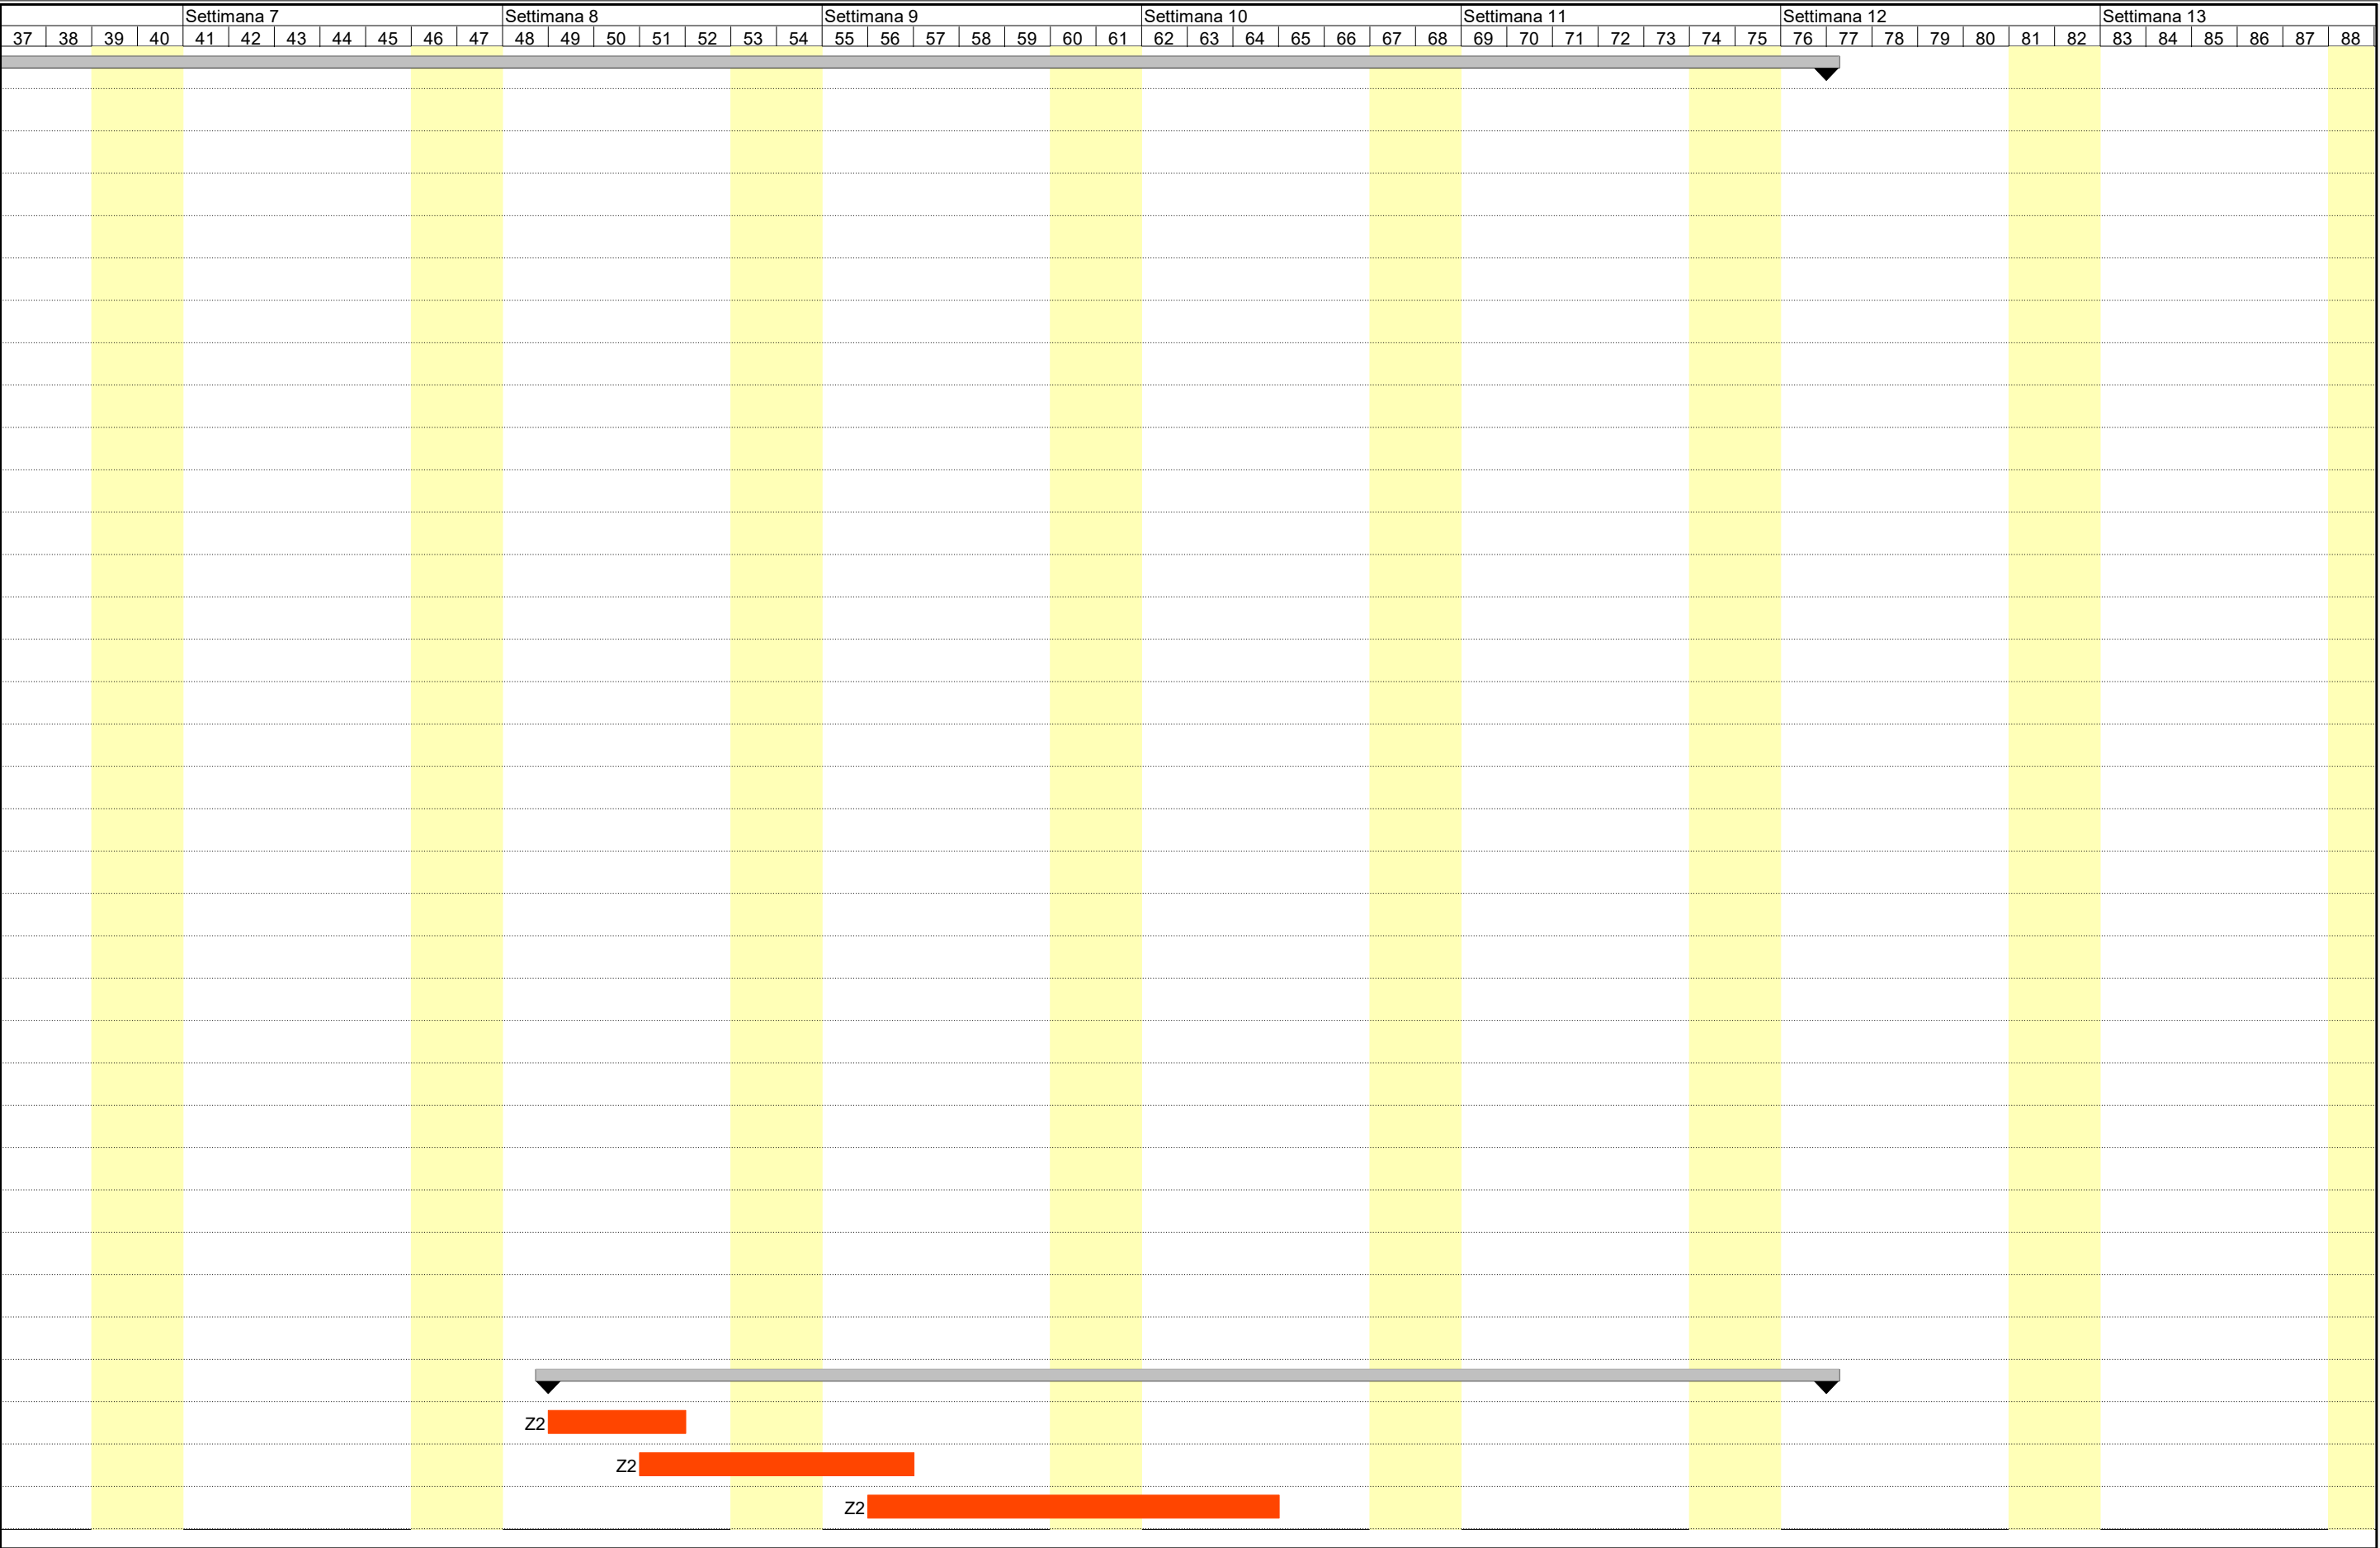

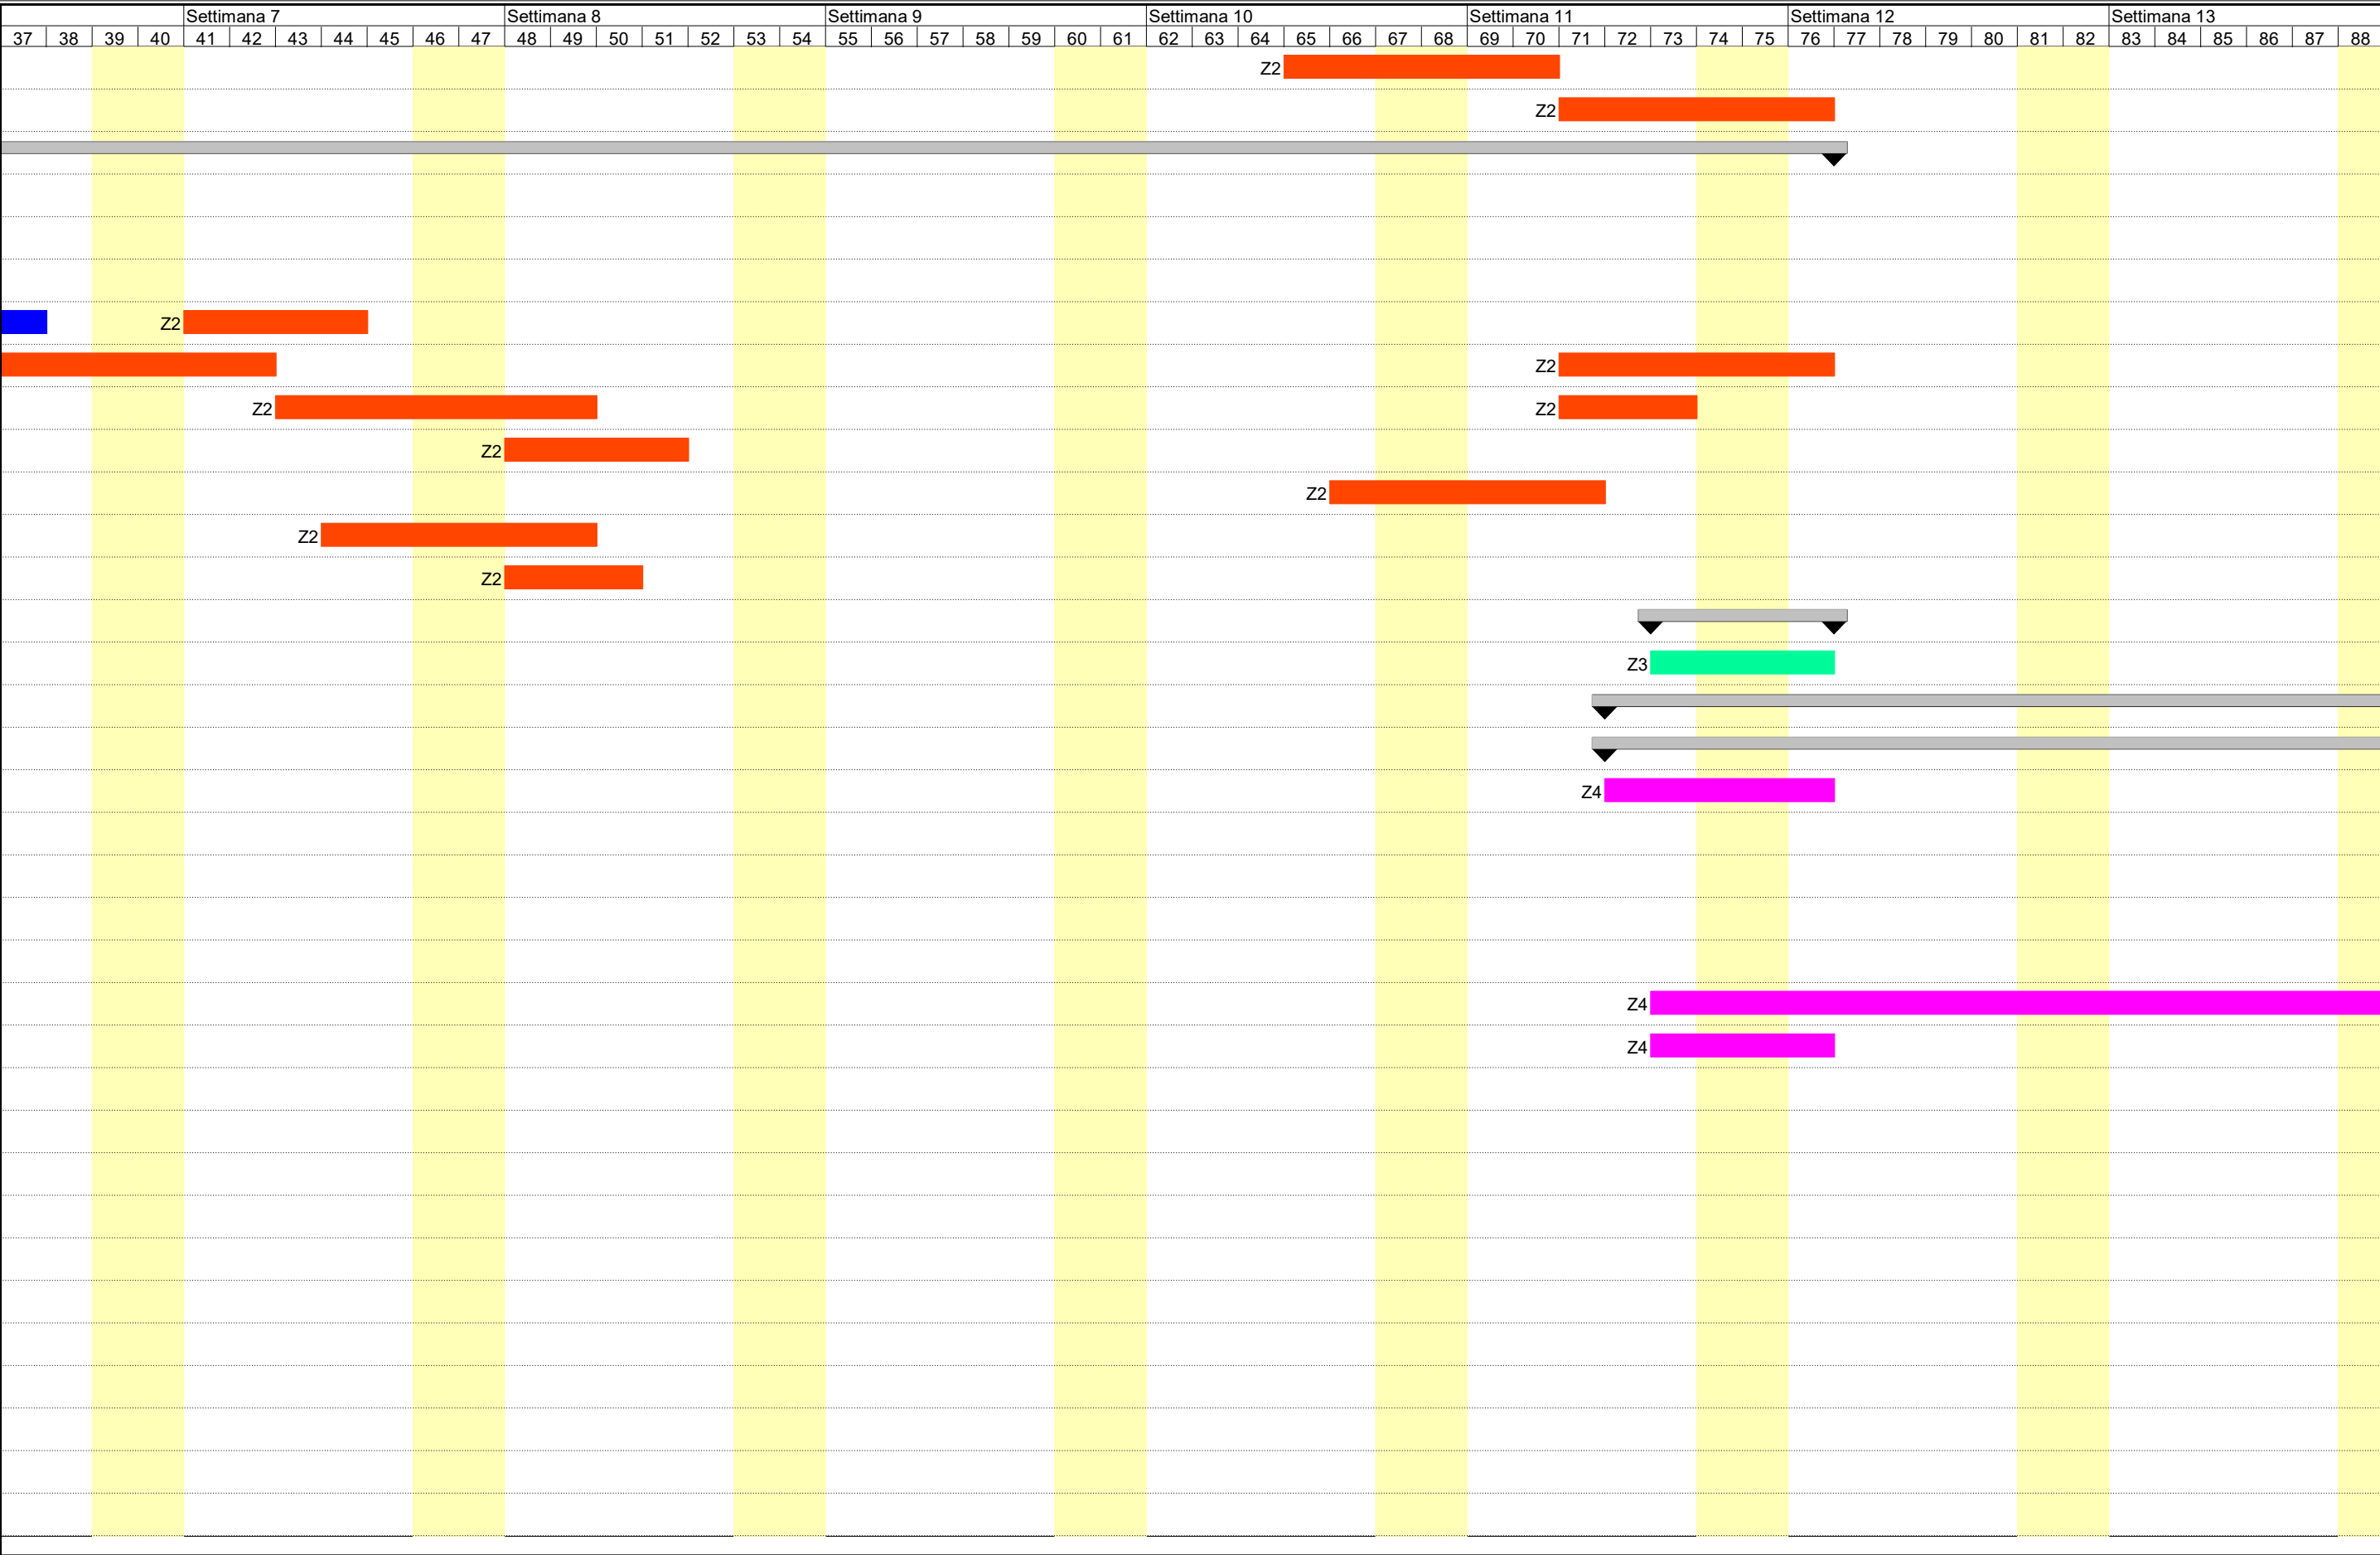



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

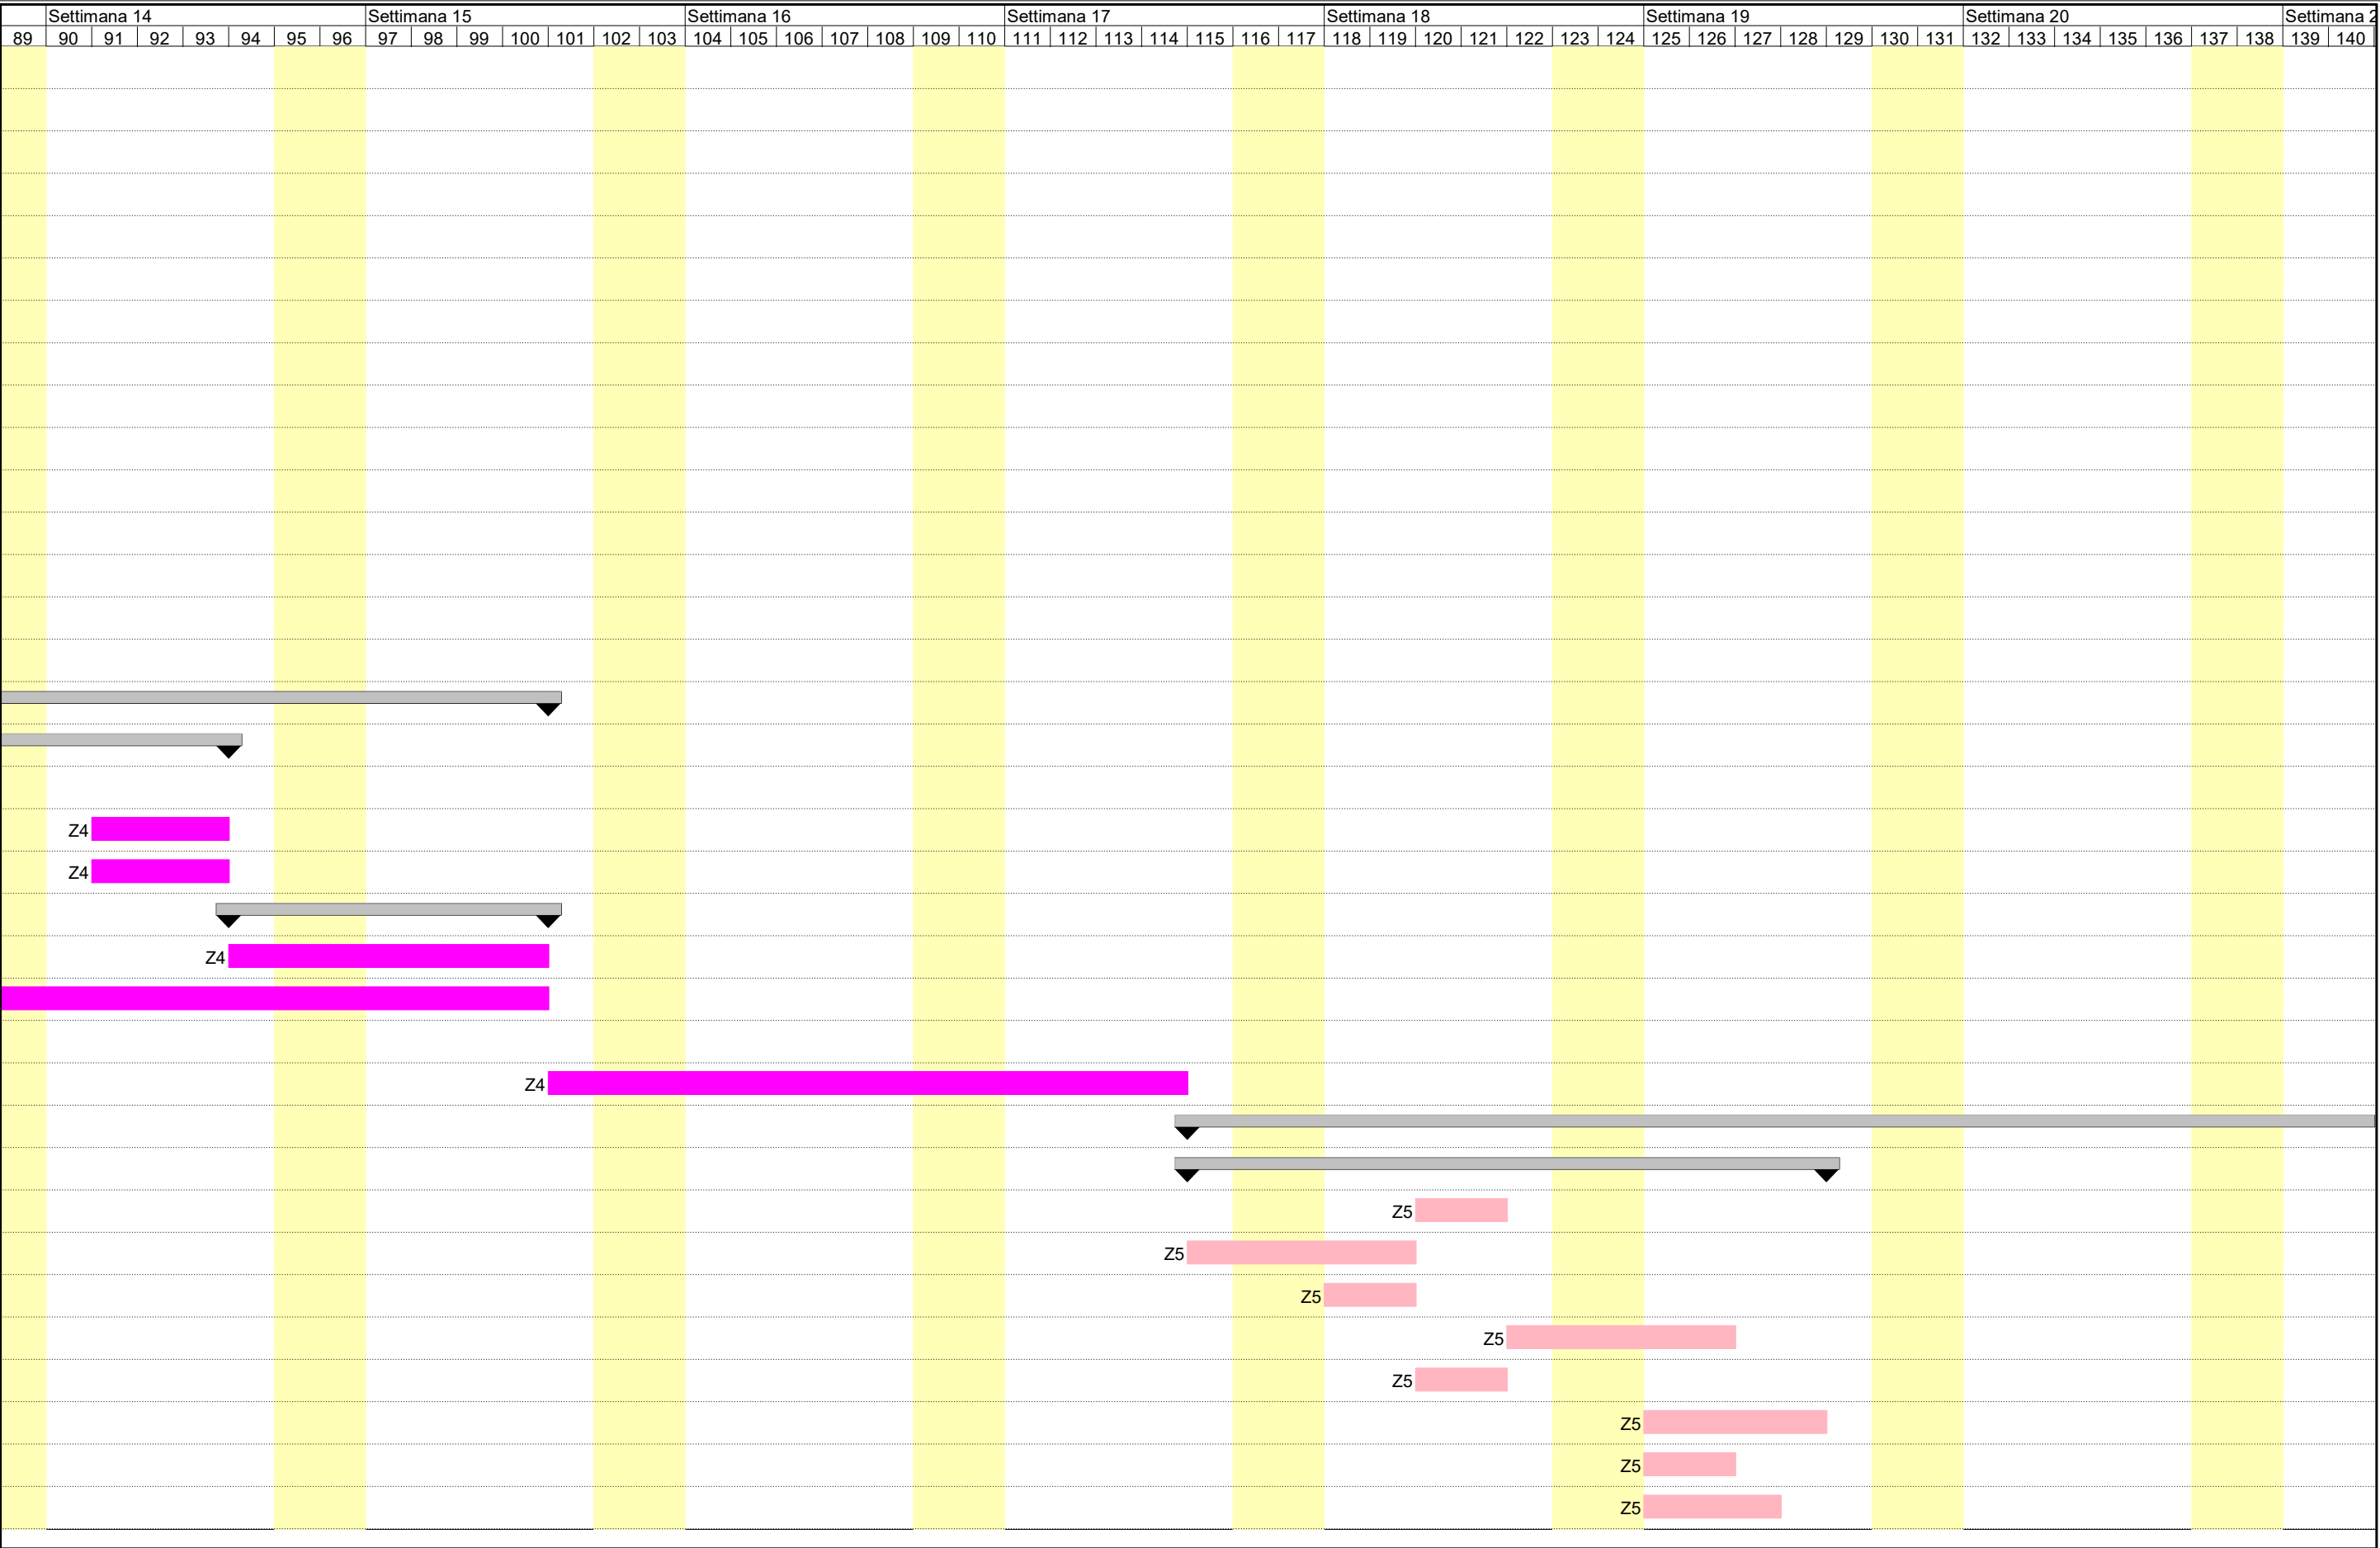

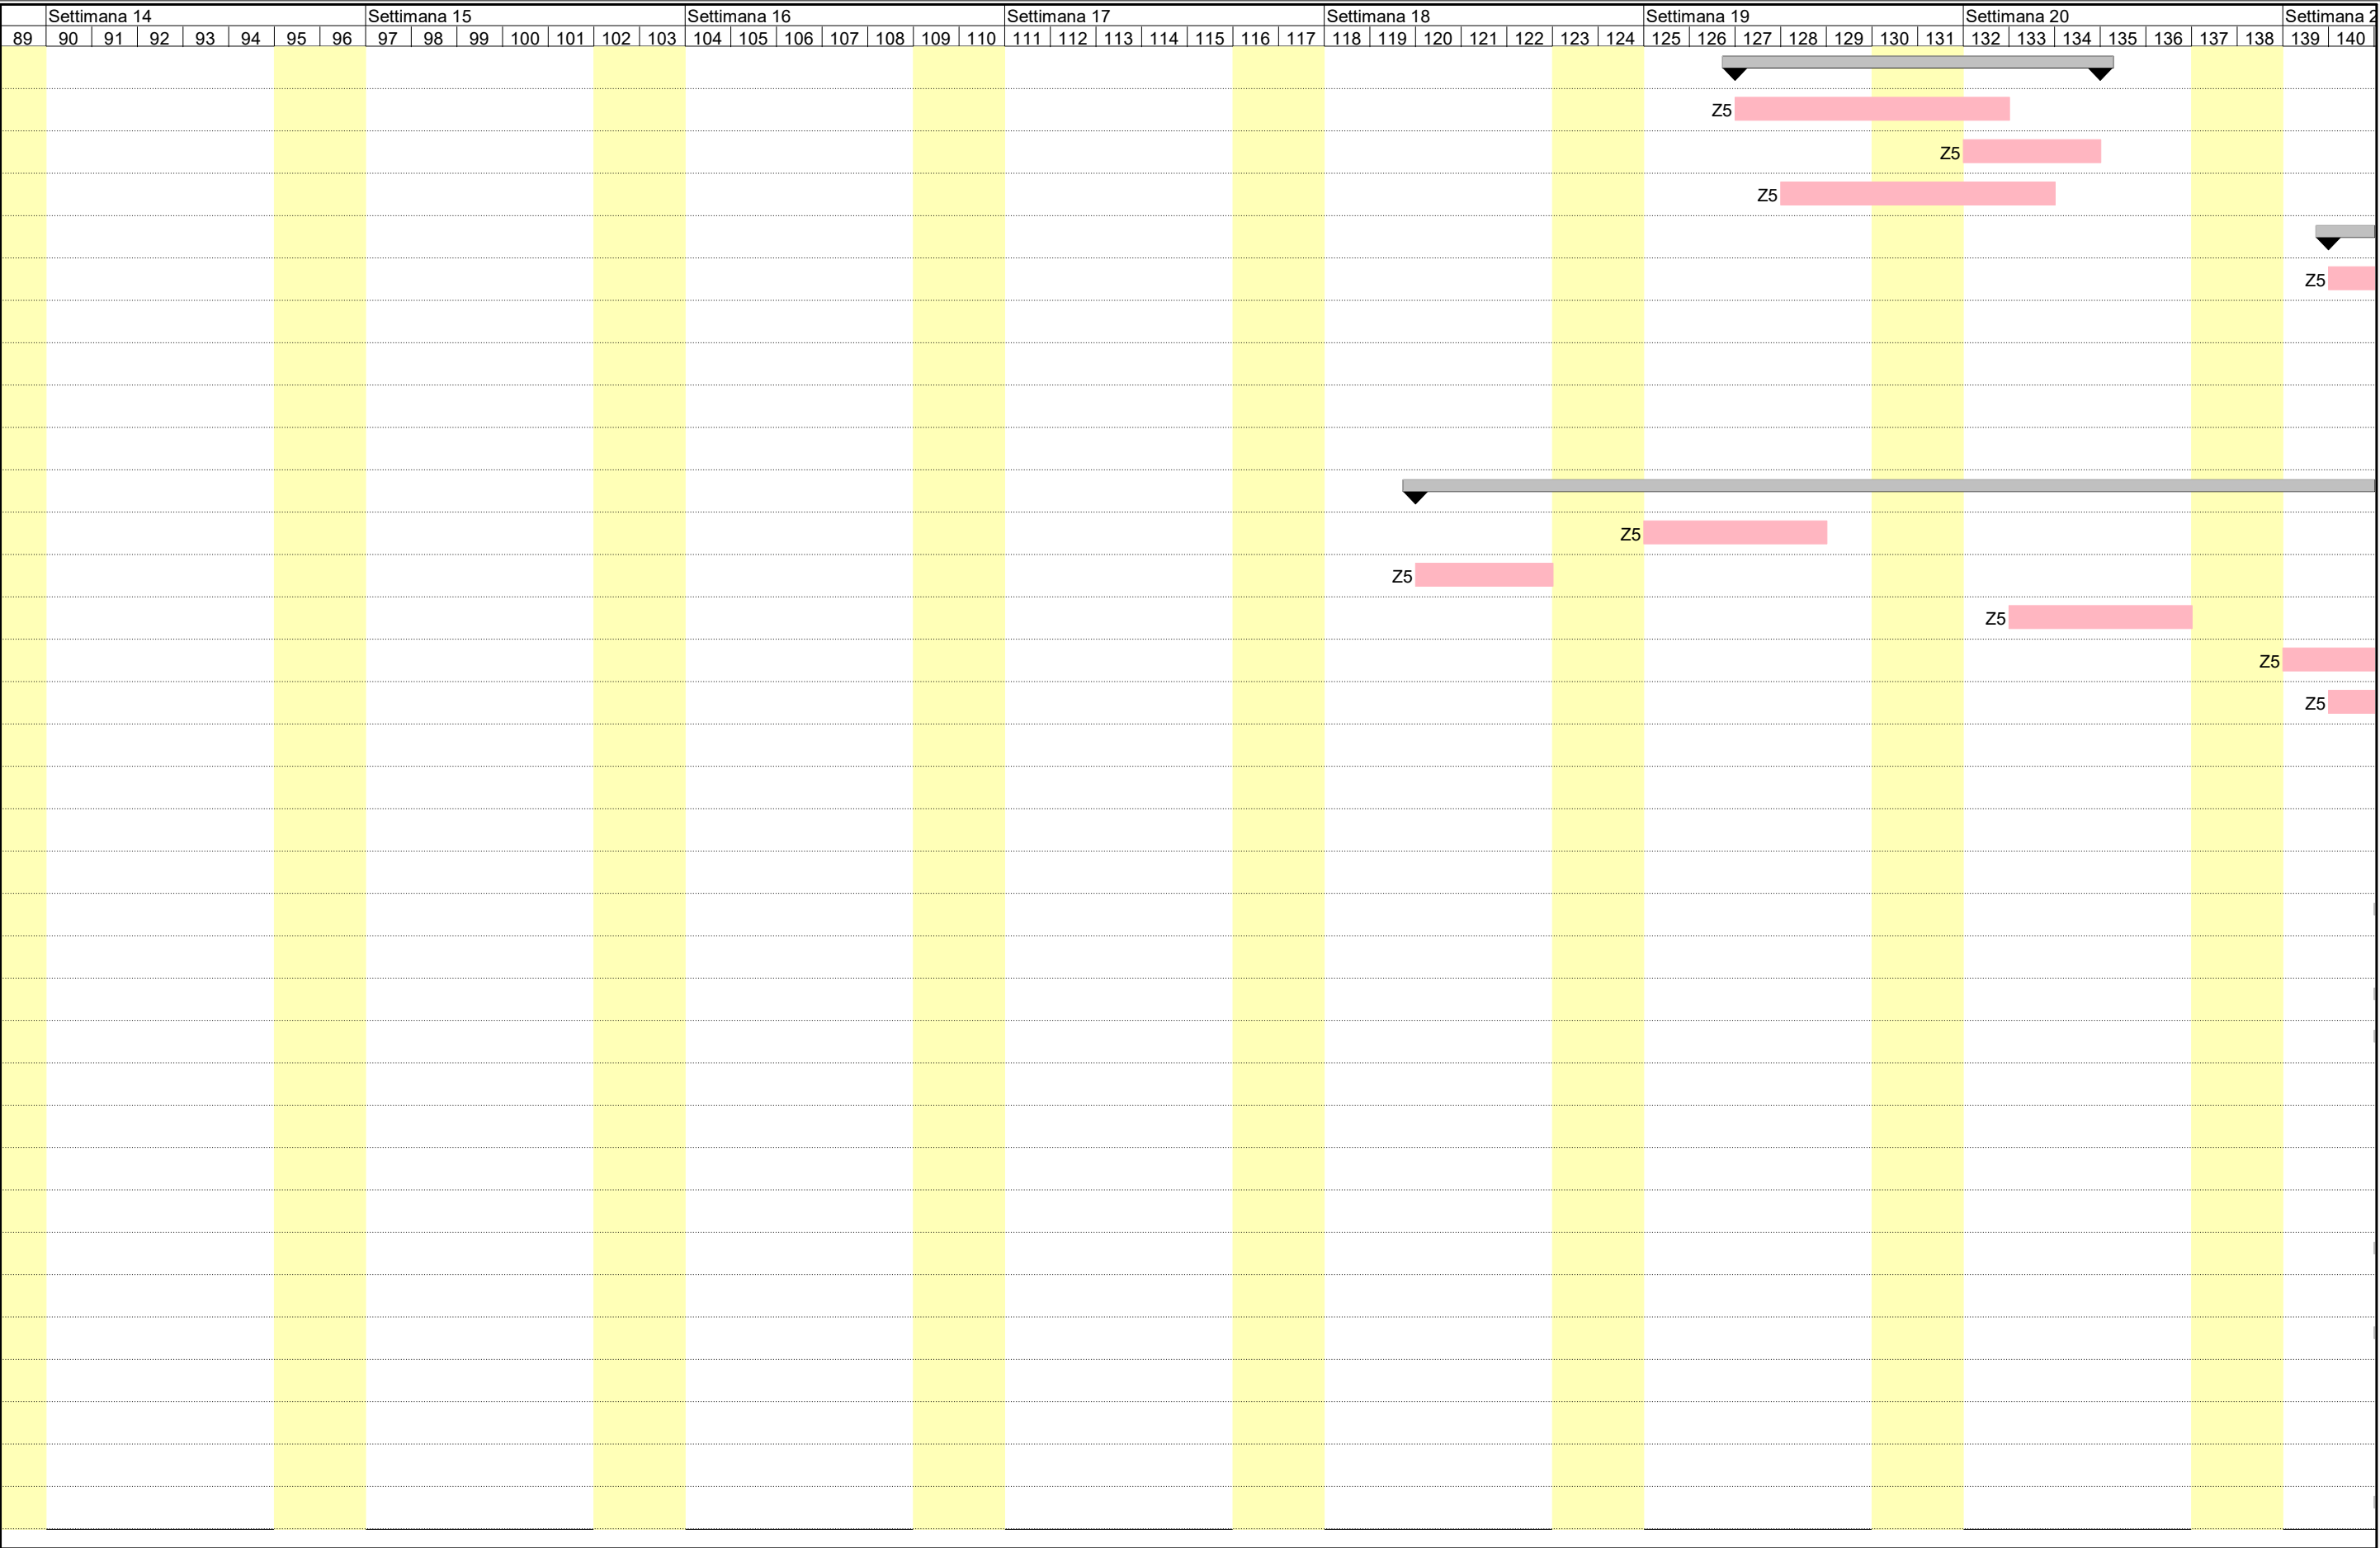


[illegible]

[illegible]

Settimana 21	Settimana 22					Settimana 23					Settimana 24					Settimana 25					Settimana 26					Settimana 27					Settimana 28																				
	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191

[illegible]

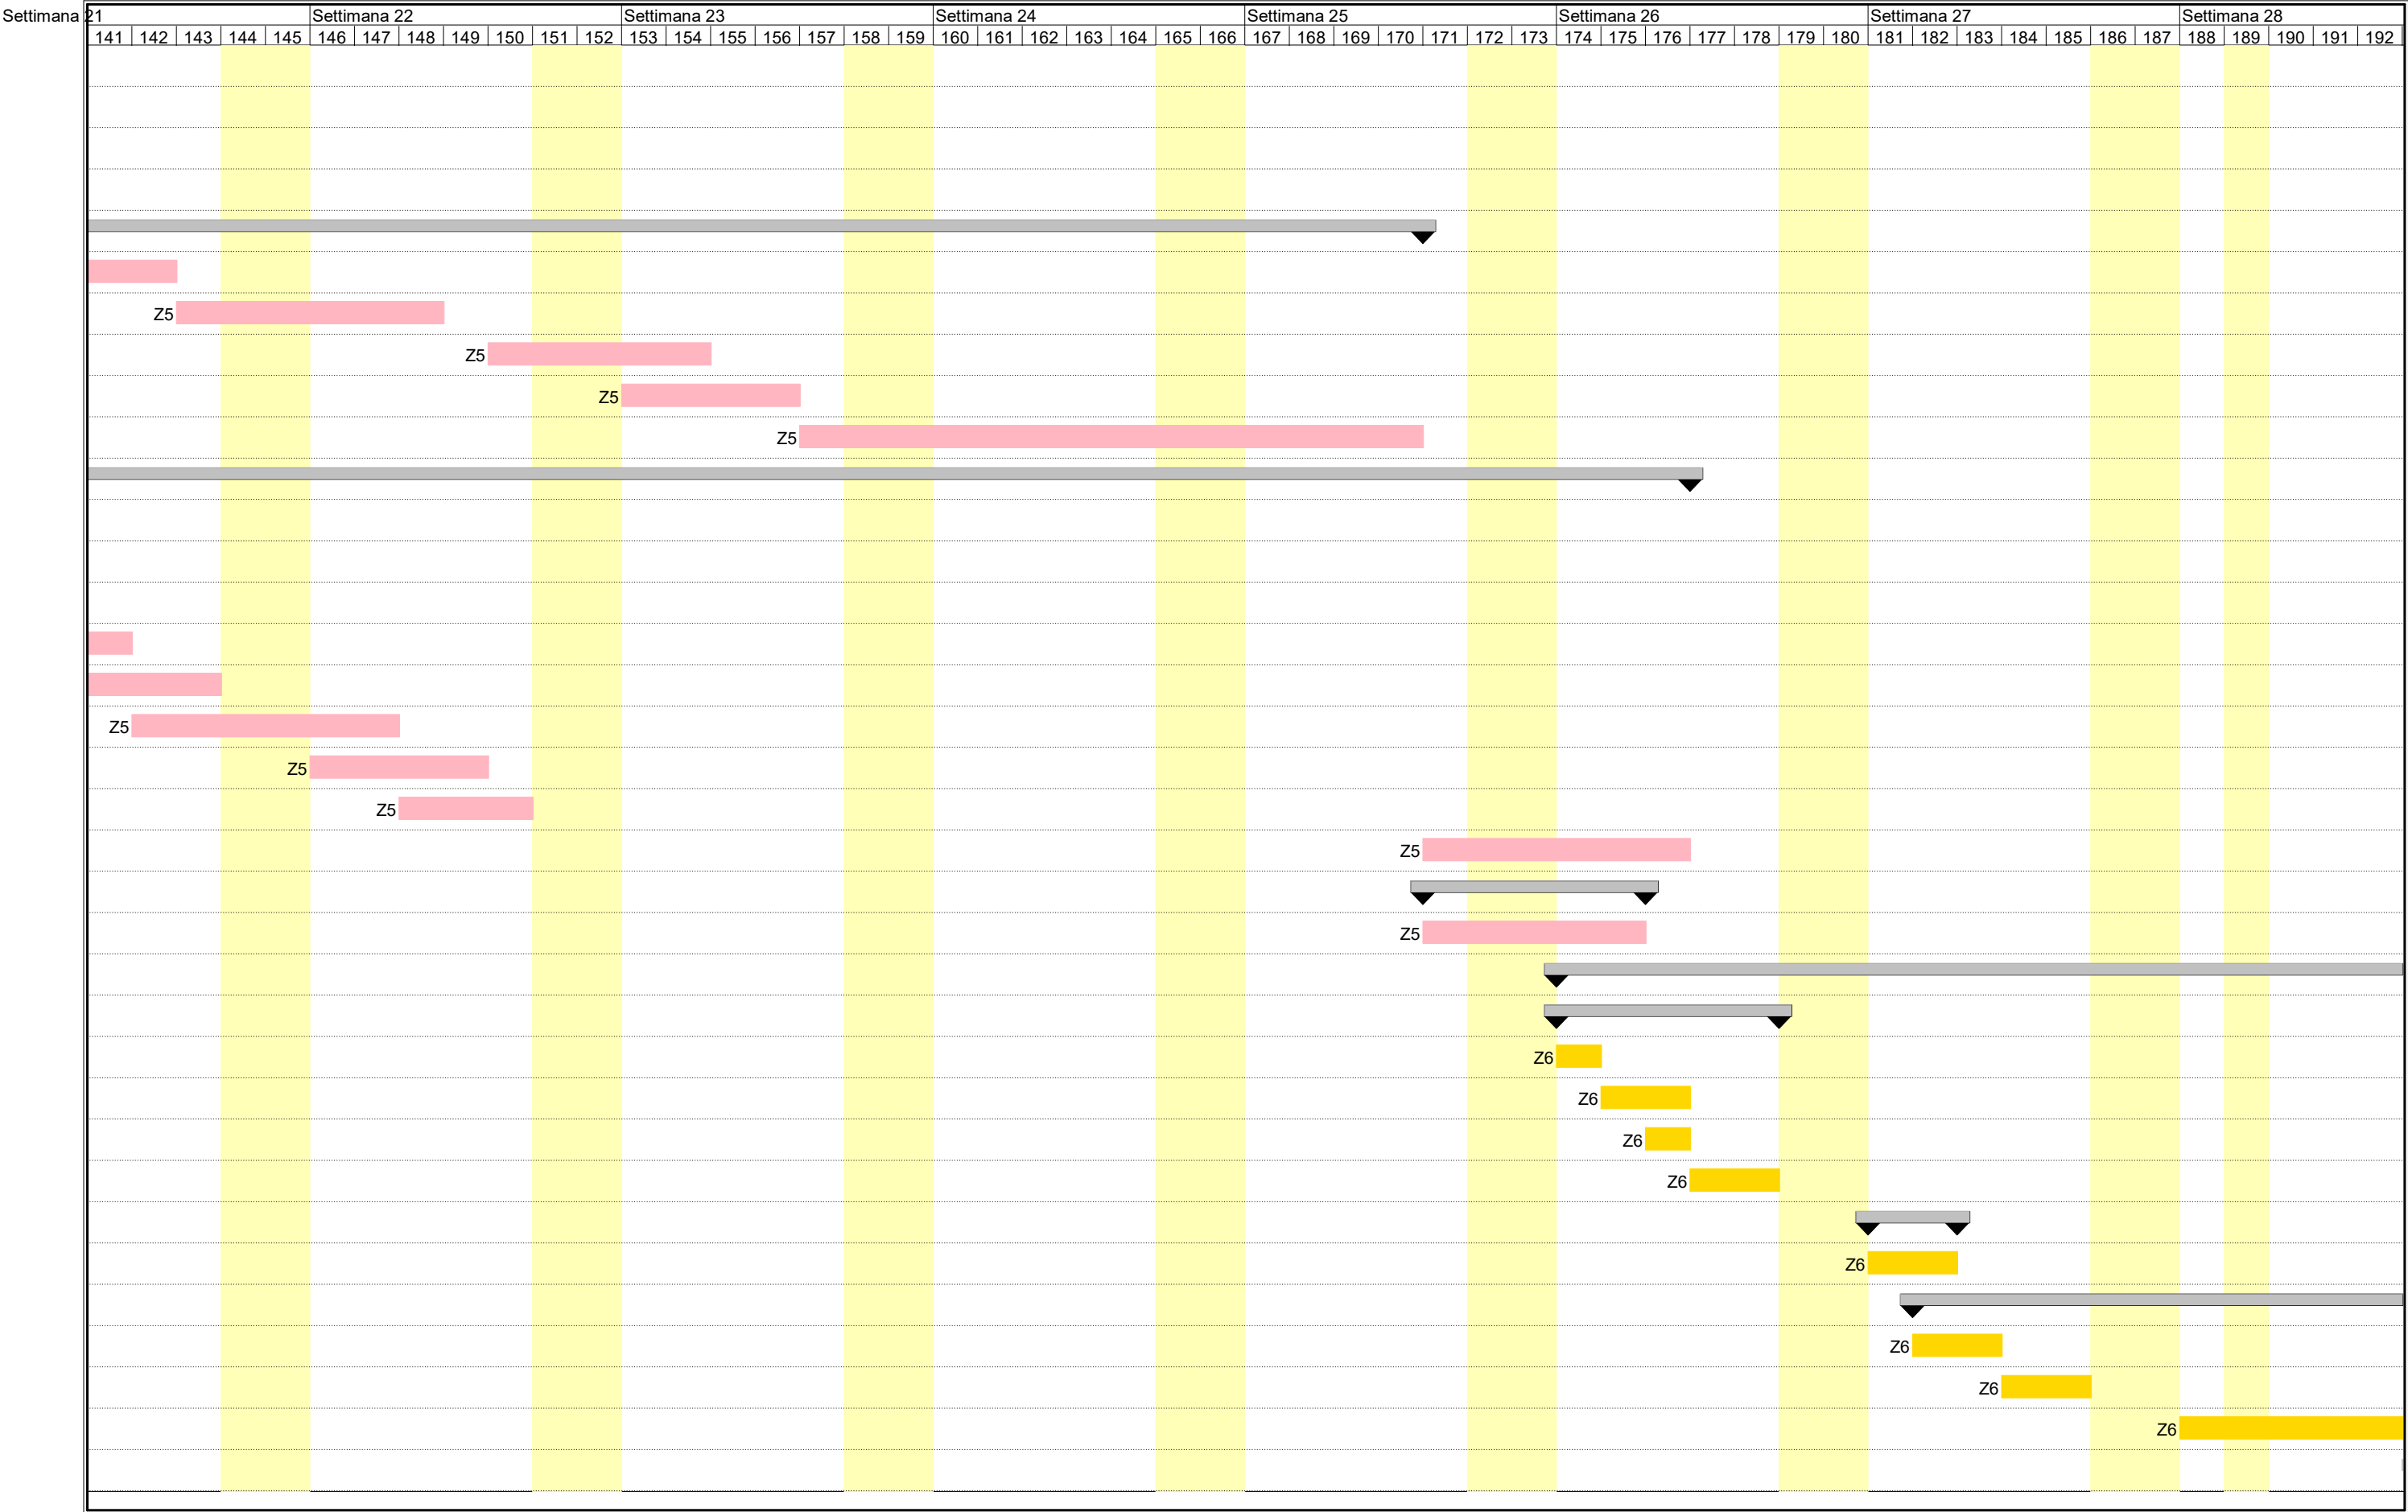


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

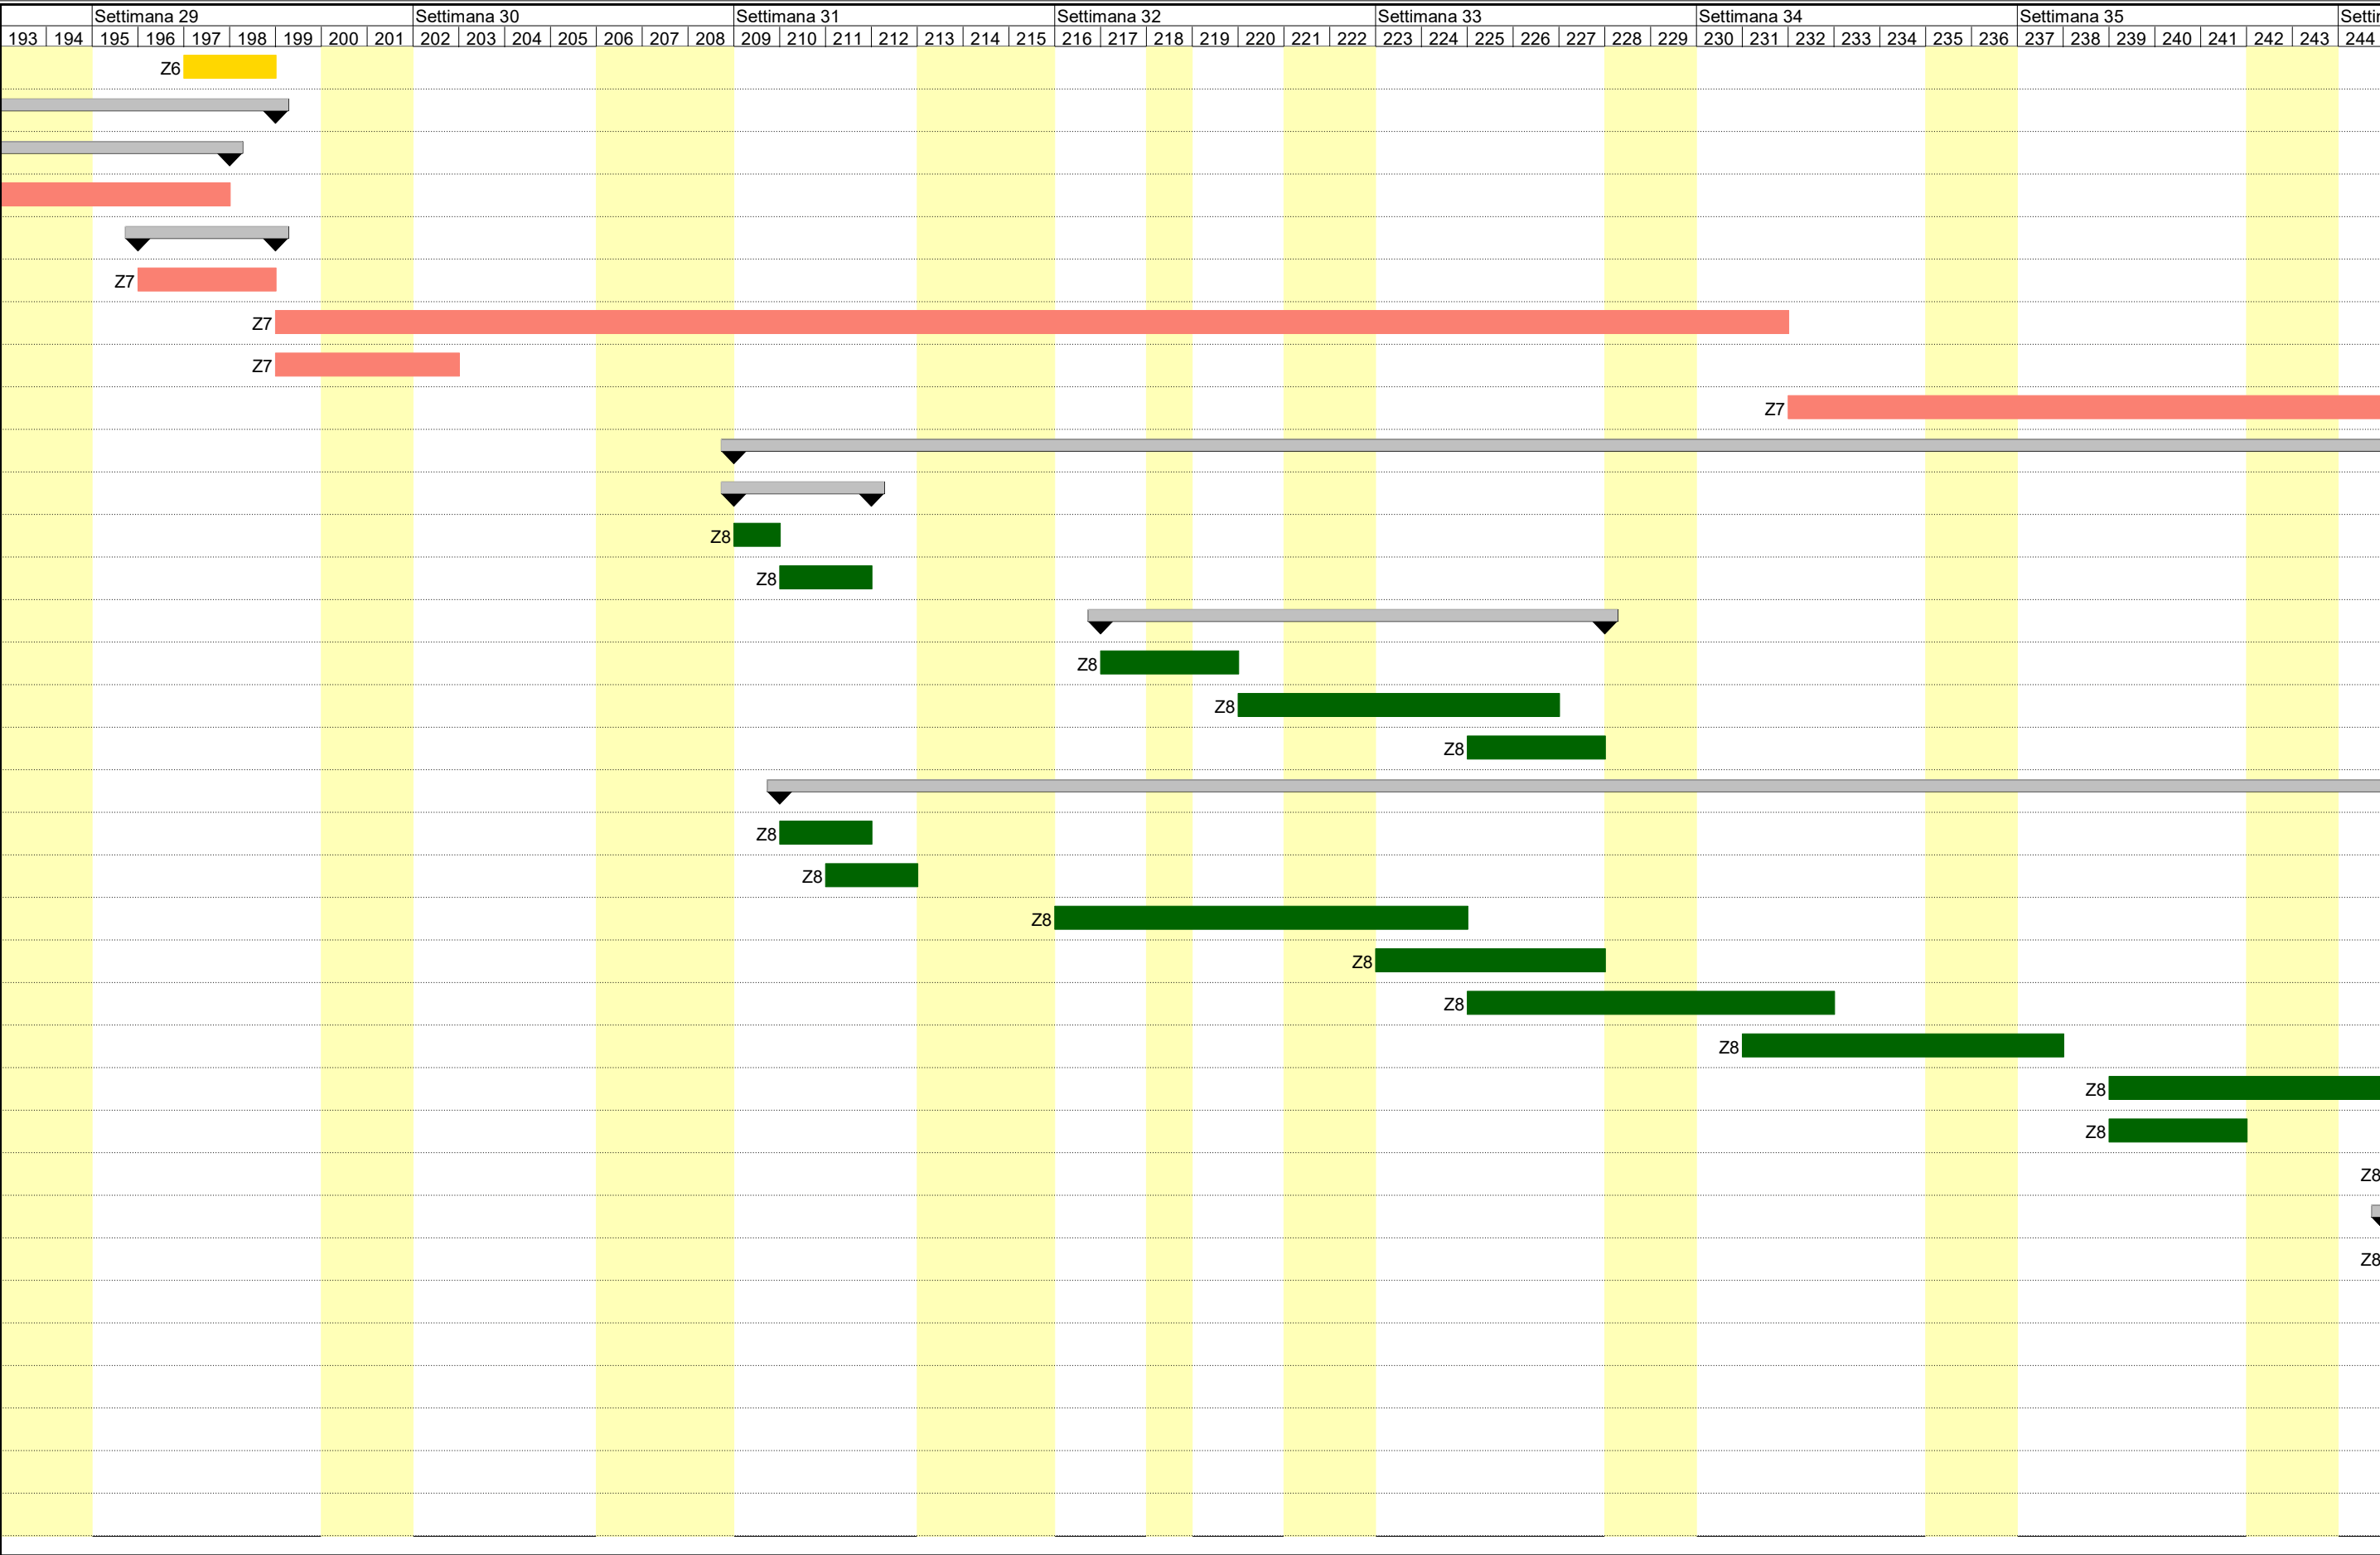


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

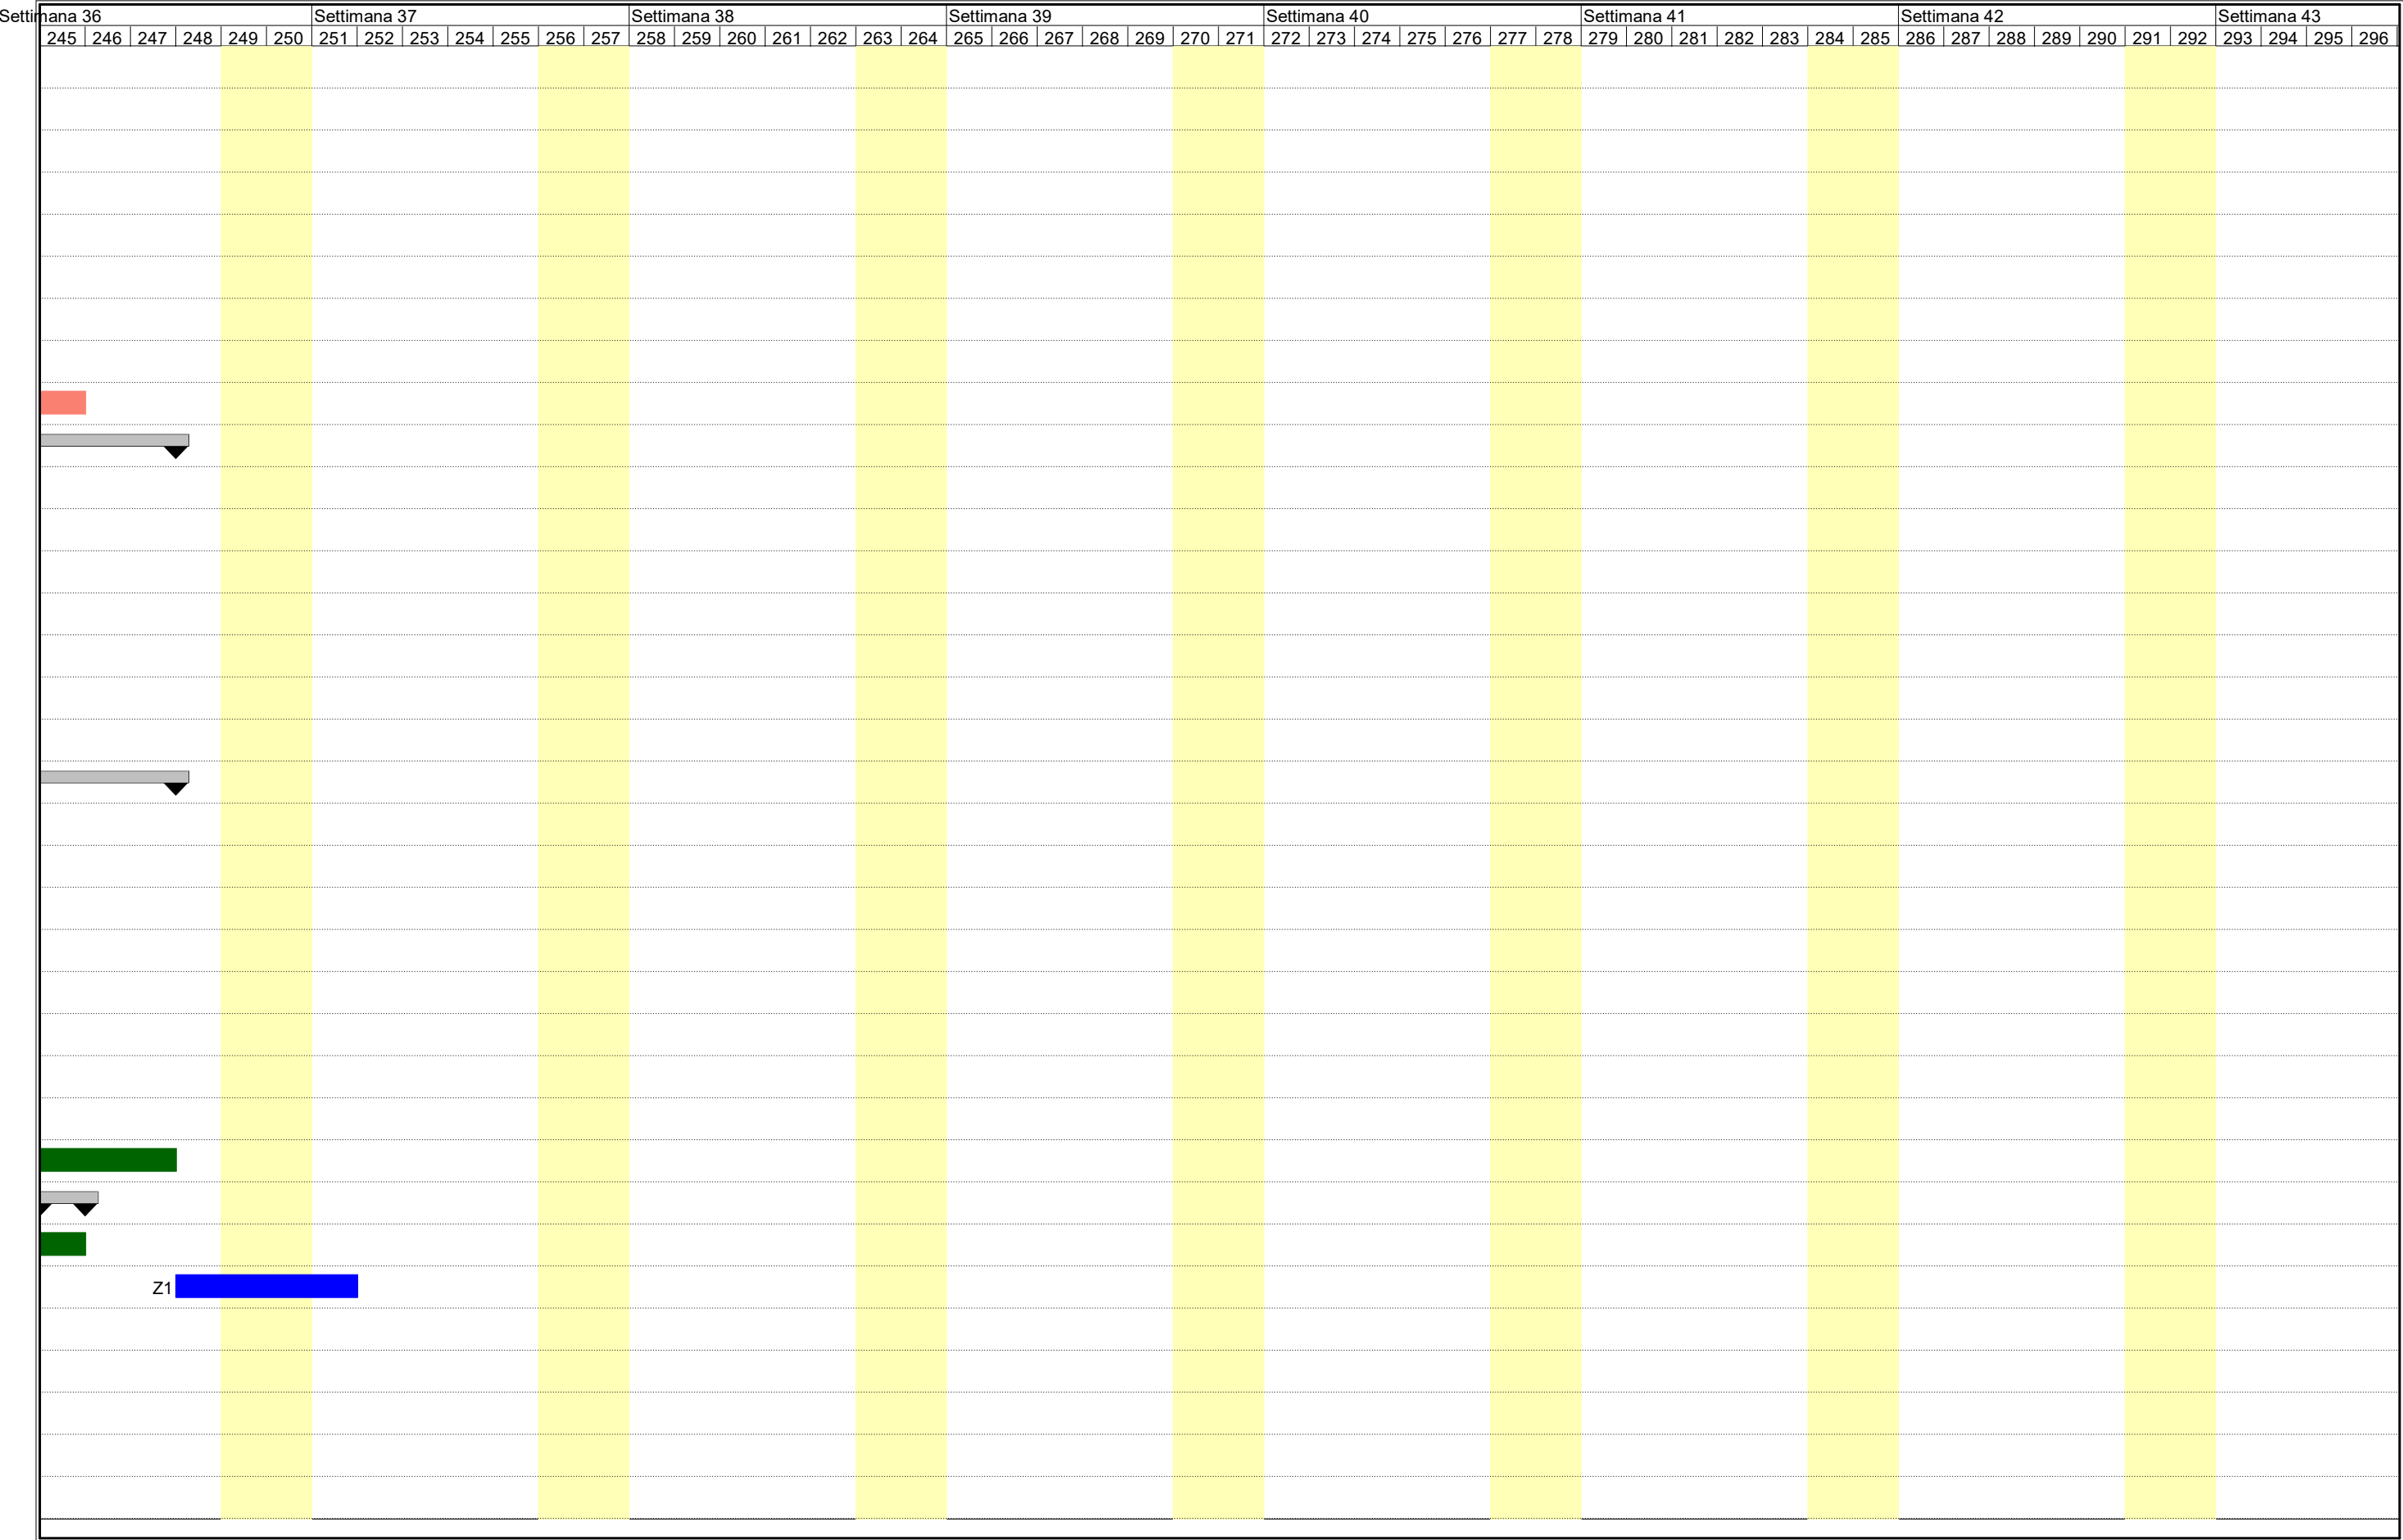

[illegible]
